

Dự án 500kV Nho Quan - Thường Tín: Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ

09:18 07/08/2025

Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), ông Phạm Lê Phú vừa trực tiếp đi kiểm tra hiện trường dự án đường dây 500/220kV Nho Quan - Phú Lý - Thường Tín, đoạn qua tỉnh Ninh Bình và chủ trì cuộc họp điều độ tiến độ triển khai dự án.



Dự án 500kV Nho Quan - Thường Tín quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ

Đây là công trình truyền tải điện trọng điểm quốc gia, đóng vai trò tăng cường năng lực liên kết lưới điện và truyền tải công suất trên trục Bắc - Nam, đồng thời góp phần đảm bảo cấp điện cho khu vực phía Nam Hà Nội, Ninh Bình, Phú Lý và lân cận.

Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan - Phú Lý - Thường Tín có chiều dài khoảng 80 km. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác bàn giao mặt bằng đã đạt khoảng 89% (207/233 vị trí móng). Trong đó, Hà Nội và Phú Thọ đã hoàn tất 100% mặt bằng, riêng tỉnh Ninh Bình mới bàn giao 105/131 vị trí, còn tồn tại 26 vị trí móng và 42 khoảng néo chưa được bàn giao.


Bên cạnh đó, một số vị trí trùng tim với đường dây 220kV hiện hữu (17 vị trí) chưa thể thi công do chưa được cắt điện. Về thi công, dự án đã hoàn thành đúc móng tại 173 vị trí, đang thi công 13 vị trí, kéo dây tại 37 khoảng néo, tuy nhiên hiện vẫn còn vị trí phải tạm dừng do vướng một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú biểu dương nỗ lực của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) và các đơn vị thi công, song đồng thời nhấn mạnh tiến độ hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Ông yêu cầu các đơn vị phải tập trung hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa để xử lý dứt điểm vướng mắc về mặt bằng, triển khai đồng bộ các hạng mục thi công.

Cụ thể, ông Phú chỉ đạo NPMB tiếp tục làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương – đặc biệt tại phường Tam Chúc (Ninh Bình) – nhằm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 8/2025. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao hành lang tuyến còn lại để đảm bảo điều kiện kéo dây, dựng cột đúng kế hoạch.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, lãnh đạo EVNNPT yêu cầu các nhà thầu khẩn trương bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai lắp dựng cột tại các vị trí đã hoàn thành móng. Toàn tuyến cần được rà soát để đồng loạt kéo dây tại các khoảng néo đã sẵn sàng. Đồng thời, hoàn thiện các hạng mục tiếp địa, kê móng, đào móng dở dưng và chuẩn bị 17 đội thi công cho 17 vị trí móng trùng tim với đường dây hiện hữu.

Tổng giám đốc EVNNPT lưu ý, trong quá trình thi công, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, đặc biệt tại các vị trí giao chéo với đường dây trung thế địa phương, không để xảy ra sự cố hoặc ảnh hưởng tới tiến độ chung.

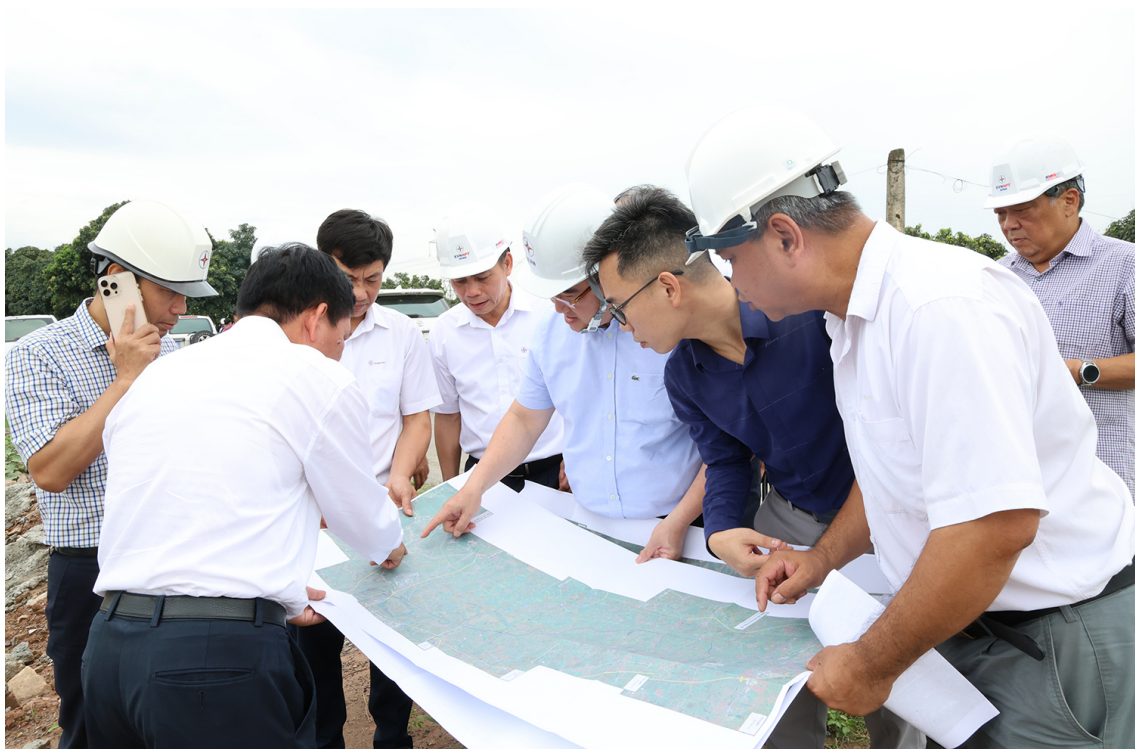

Lãnh đạo EVN, EVNNPT nghe báo cáo tiến độ thi công dự án đoạn qua địa bàn Ninh Bình

Bên cạnh đó, ông Phú yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương làm rõ phương án thi công cho từng vị trí cụ thể, phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan để sớm thống nhất phương án nổ mìn đối với các vị trí móng đá. NPMB cũng được giao nhiệm vụ làm việc với các nhà cung cấp để hoàn tất bàn giao toàn bộ vật tư, thiết bị trước ngày 15/8/2025.

Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lộ trình hoàn thiện hệ thống truyền tải điện quốc gia. Việc đẩy nhanh tiến độ và xử lý triệt để các vướng mắc là nhiệm vụ cấp thiết nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn và liên tục cho các địa phương trọng điểm.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối trong thi công, sẵn sàng đưa công trình vào vận hành trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Kiên
