

Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc CT.08

09:44 10/10/2025

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị hoàn thành việc bàn giao mặt bằng dự án cao tốc CT.08 trong tháng 11/2025.

Ngày 10/10, UBND tỉnh Hưng Yên thông tin, dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng theo phương thức PPP, đoạn qua tỉnh Hưng Yên, đến nay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 203 ha, đạt 98,6% tổng diện tích. Trong đó, phần đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi đã được bàn giao với tỷ lệ đạt 93,7%. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với diện tích đất ở còn lại đang được triển khai, dự kiến hoàn tất trong năm 2026.



Ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp


Trên địa bàn Hưng Yên, các nhà thầu, đơn vị tư vấn và thi công đang khẩn trương tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ tại các hạng mục trọng điểm như cầu vượt sông Hồng, cầu Trà Lý, các cấu kiện bê tông và hệ thống cầu, cống.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số vị trí nằm trong khu dân cư hoặc thuộc diện đất chuyển đổi, đất nông nghiệp chưa được bàn giao mặt bằng, gây ảnh hưởng

nhất định đến tiến độ chung của dự án.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, cũng như việc đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh và thu hút đầu tư cho Hưng Yên cũng như khu vực Đồng bằng sông Hồng.

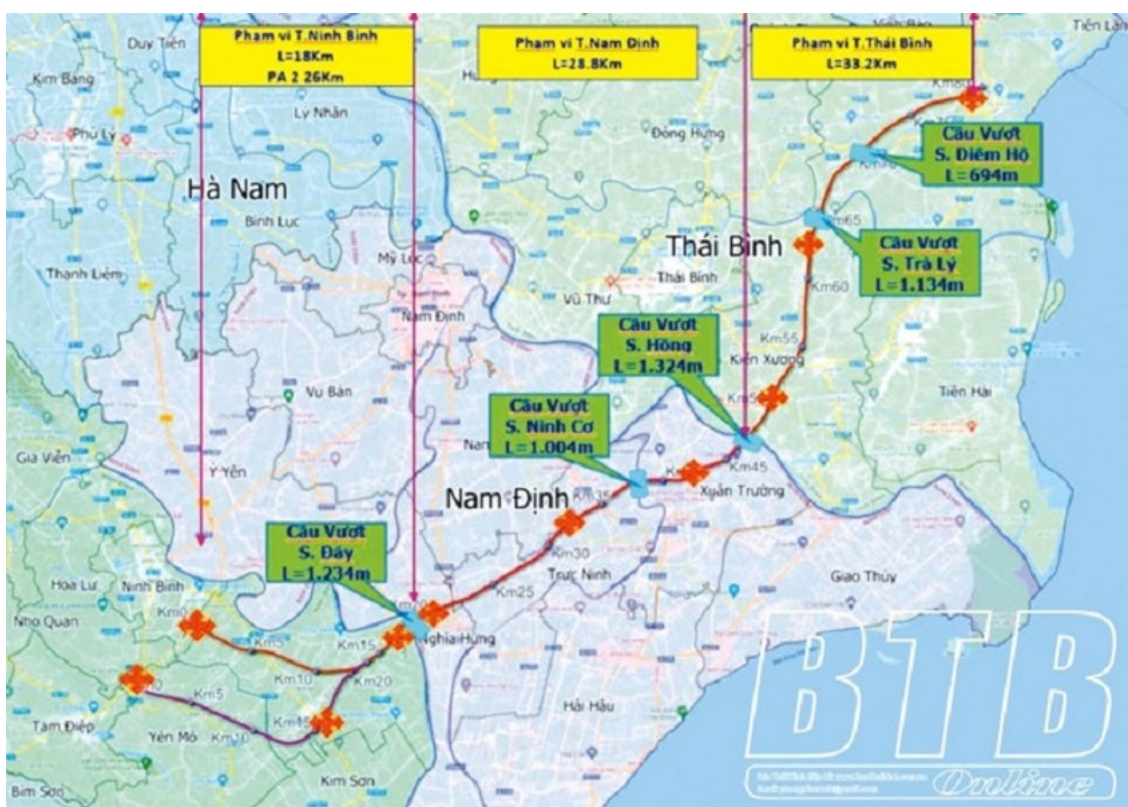

Tuyến của dự án CT.08,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các cấp, ngành và địa phương tiếp tục tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, kiên quyết tháo gỡ các điểm nghẽn, đồng thời bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng ổn định, đáp ứng yêu cầu tiến độ. Chậm nhất đến hết tháng 11/2025 phải hoàn thành việc bàn giao toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, đất ở đã rõ nguồn gốc và đất tái định cư.

Cùng với đó, các đơn vị liên quan cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng, sớm bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện để các hạng mục dự án được triển khai thuận lợi, đồng bộ và hiệu

quả.

Bùi Tú
