

Thanh Hóa: Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai công trình cầu Mọ

17:28 02/03/2026

Ngày 2/3, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai công trình cầu Mọ, bắc qua sông Cầu Chày trên địa bàn xã Xuân Tín.




Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình

Theo báo cáo của Ban Quản lý Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, cơ bản số 10 năm 2025 cuốn trôi công trình cầu Mọ trên địa bàn xã Xuân Tín, gây ảnh hưởng lớn tới đời sống, sinh hoạt, giao thương của người dân. Để đảm bảo nhanh chóng giải quyết tình trạng đứt gãy giao thông, sớm kết nối lại mạng lưới

giao thông trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân lưu thông qua hai bên bờ sông Cầu Chày thuộc xã Xuân Tín và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong khu vực, UBND tỉnh có Quyết định số 4072/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 phê duyệt dự án Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai công trình cầu Mọ, bắc qua sông Cầu Chày trên địa bàn xã Xuân Tín, với kinh phí 70 tỷ đồng. Dự án có quy mô sử dụng 2,28 ha, ảnh hưởng tới đất nông nghiệp và đất ở của 33 hộ gia đình.

Theo phê duyệt, dự án gồm, xây dựng mới 1 cầu có chiều rộng 8,0m, kết cấu bằng bê tông cốt thép, bê tông cốt thép dự ứng lực và phần đường hai đầu cầu quy mô đường cấp V đồng bằng. Thời gian hoàn thành dự án trong quý 3 năm 2026; riêng công trình cầu Mọ phải đảm bảo thông xe kỹ thuật trước ngày 1/7/2026.

Sau thời gian thi công, tính đến ngày 2/3/2026, giá trị khối lượng đã thi công 11/61,1 tỷ đồng, đạt 18%; Kế hoạch vốn giao đến nay là 35/61,1 tỷ đồng, đạt 57%. Cùng với đó, chủ đầu tư, nhà thầu thi công và chính quyền địa phương đã vận động nhân dân, đơn vị liên quan bàn giao được 0,6/0,7km (đạt 86% chiều dài tuyến), với diện tích là 13.978m².

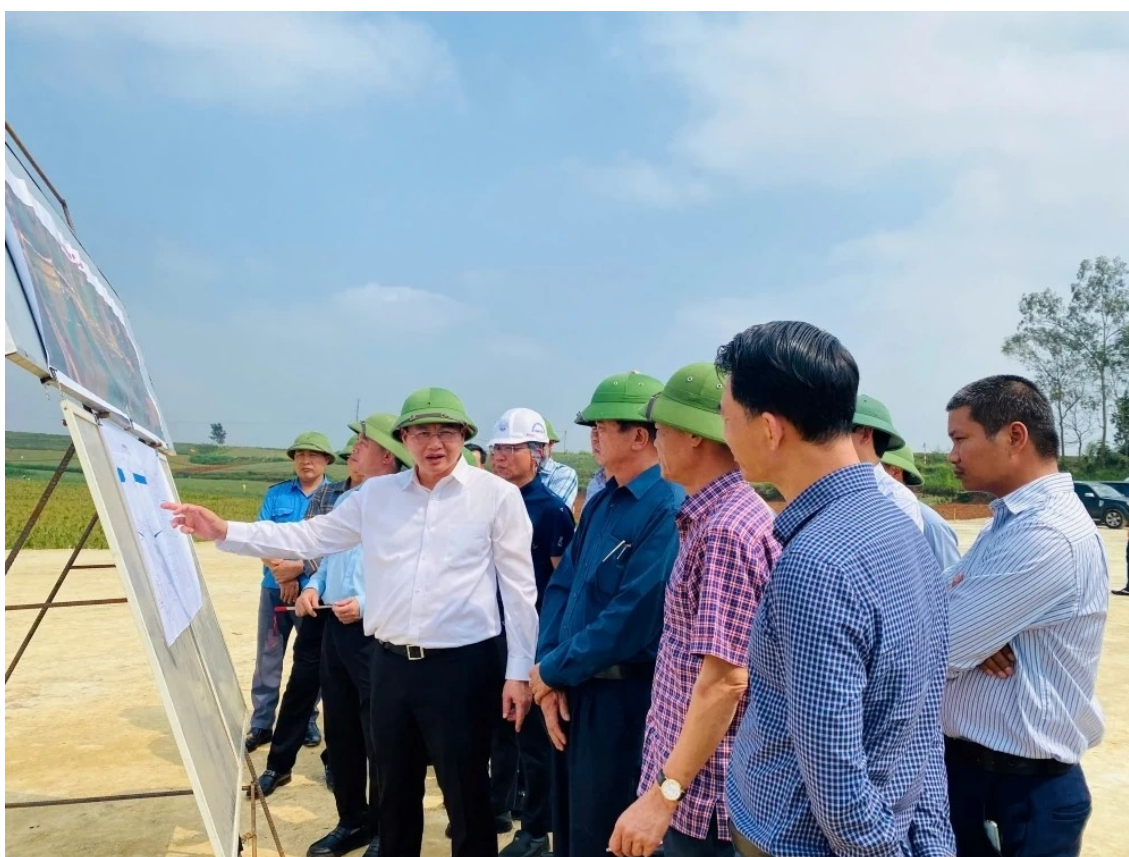

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra tiến độ thi công dự án.

Tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư, địa phương đã nêu ra một số khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án, như: Còn 4 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng nên nhà thầu chưa triển khai thi công được; tình trạng thiếu vật liệu xây dựng...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định, công trình cầu Mọ có vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với mạng lưới giao thông hai bên bờ sông Cầu Chày, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong khu vực. Do đó, để dự án được triển khai xây dựng, hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Xuân Tín tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư tổ chức triển khai thi công trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, xem xét, bố trí tái định cư, xen cư cho hộ dân, bảo đảm quyền lợi cho 3 hộ dân bị ảnh hưởng tới đất ở.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu, chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tập trung huy động nhân lực, phương tiện thi công các dự án bảo đảm tiến độ, kỹ thuật và hoàn thiện công trình cầu Mọ trước ngày 30/6/2026 hướng tới hoàn thành dự án trong quý III năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao các sở, ngành có liên quan tăng cường kiểm tra chất lượng thi công công trình, nhất là chất lượng mặt đường, mặt cầu. Đồng thời, có các chỉ đạo cụ thể để nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Khánh An
