TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ cụm dự án truyền tải giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

09:52 27/05/2025

Ngày 22/5/2025, tại Đồng Nai, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Phạm Lê Phú và đoàn công tác đã đi kiểm tra và đôn đốc tiến độ thi công các dự án truyền tải giải tỏa công suất Nhà máy điện (NMĐ) Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Tham gia đoàn công tác có đại diện các Ban chuyên môn của EVNNPT, lãnh đạo Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB), Ban QLDA Truyền tải điện (NPTPMB).



Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú và đoàn công tác đi thực địa kiểm tra tiến độ thi công dự án truyền tải giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

Đây là các dự án trọng điểm, có vai trò quan trọng trong việc giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3 và NMĐ Nhơn Trạch 4, tăng cường liên kết lưới, truyền tải

công suất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh khu vực phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Nai. Khi các dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Ban QLDA Truyền tải điện – đơn vị được giao triển khai Dự án đường dây 220kV Nhơn Trạch 3 rẽ Mỹ Xuân – Cát Lái cho biết: Dự án đi qua địa bàn xã Vĩnh Thanh và xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Hiện nay đã vận động bàn giao mặt bằng và hoàn thành đúc móng toàn bộ vị trí và đang tổ chức dựng cột. Hiện còn 4 vị trí trùng tim tuyến, đang đăng ký cắt điện để thi công.



Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú nghe báo cáo tình hình triển khai tiến độ dự án truyền tải giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3

Đại diện Ban QLDA các công trình điện miền Nam– đơn vị được giao quản lý điều hành Dự án đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - TBA 500kV Long Thành cho biết: Dự án đi qua các huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đến nay dự án đã vận động bàn giao 50/87 vị trí móng, đào móng 49/87 vị trí; Đúc móng 46/87 vị trí; Dựng cột được 20/87 vị trí.

Đối với Dự án Đường dây 220kV Long Thành - Công nghệ cao, đại diện SPMB cho biết: Dự án đi trên địa bàn huyện Long Thành, thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai và thành phố Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay dự án đã thực hiện xong công tác đo vẽ; đang phối hợp với UBND huyện Long Thành cùng các phòng ban liên quan lên lịch họp dân triển khai dự án.


Đối với dự án Trạm biến áp 220kV KCN Nhơn Trạch và đấu nối, đại diện SPMB cho biết đến nay dự án đã vận động bàn giao mặt bằng 27.260/35.627m2. Đã thi công các Nhà điều khiển nhà bơm, nhà bảo vệ, nhà nghỉ ca; Đang thi công hoàn thiện móng thiết bị SPP 220kV và mương cáp, hàng rào.



Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú tặng quà động viên các đơn vị tham gia thi công dự án

Tại buổi kiểm tra công trường, Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú nhấn mạnh đây là cụm dự án truyền tải có ý nghĩa rất quan trọng đối với hệ thống điện quốc gia. Sau khi các dự án hoàn thành sẽ giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 vào hệ thống điện quốc gia sẽ góp phần tăng tổng công suất nguồn thêm hơn 1.600MW phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân.

Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, Bộ Công Thương, các bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, các sở, ngành, địa phương huyện Nhơn Trạch, Long Thành (tỉnh Đồng Nai), sự ủng hộ của người dân có dự án đi qua đã hỗ trợ tối đa mặt bằng để các đơn vị đẩy nhanh thi công các dự án.

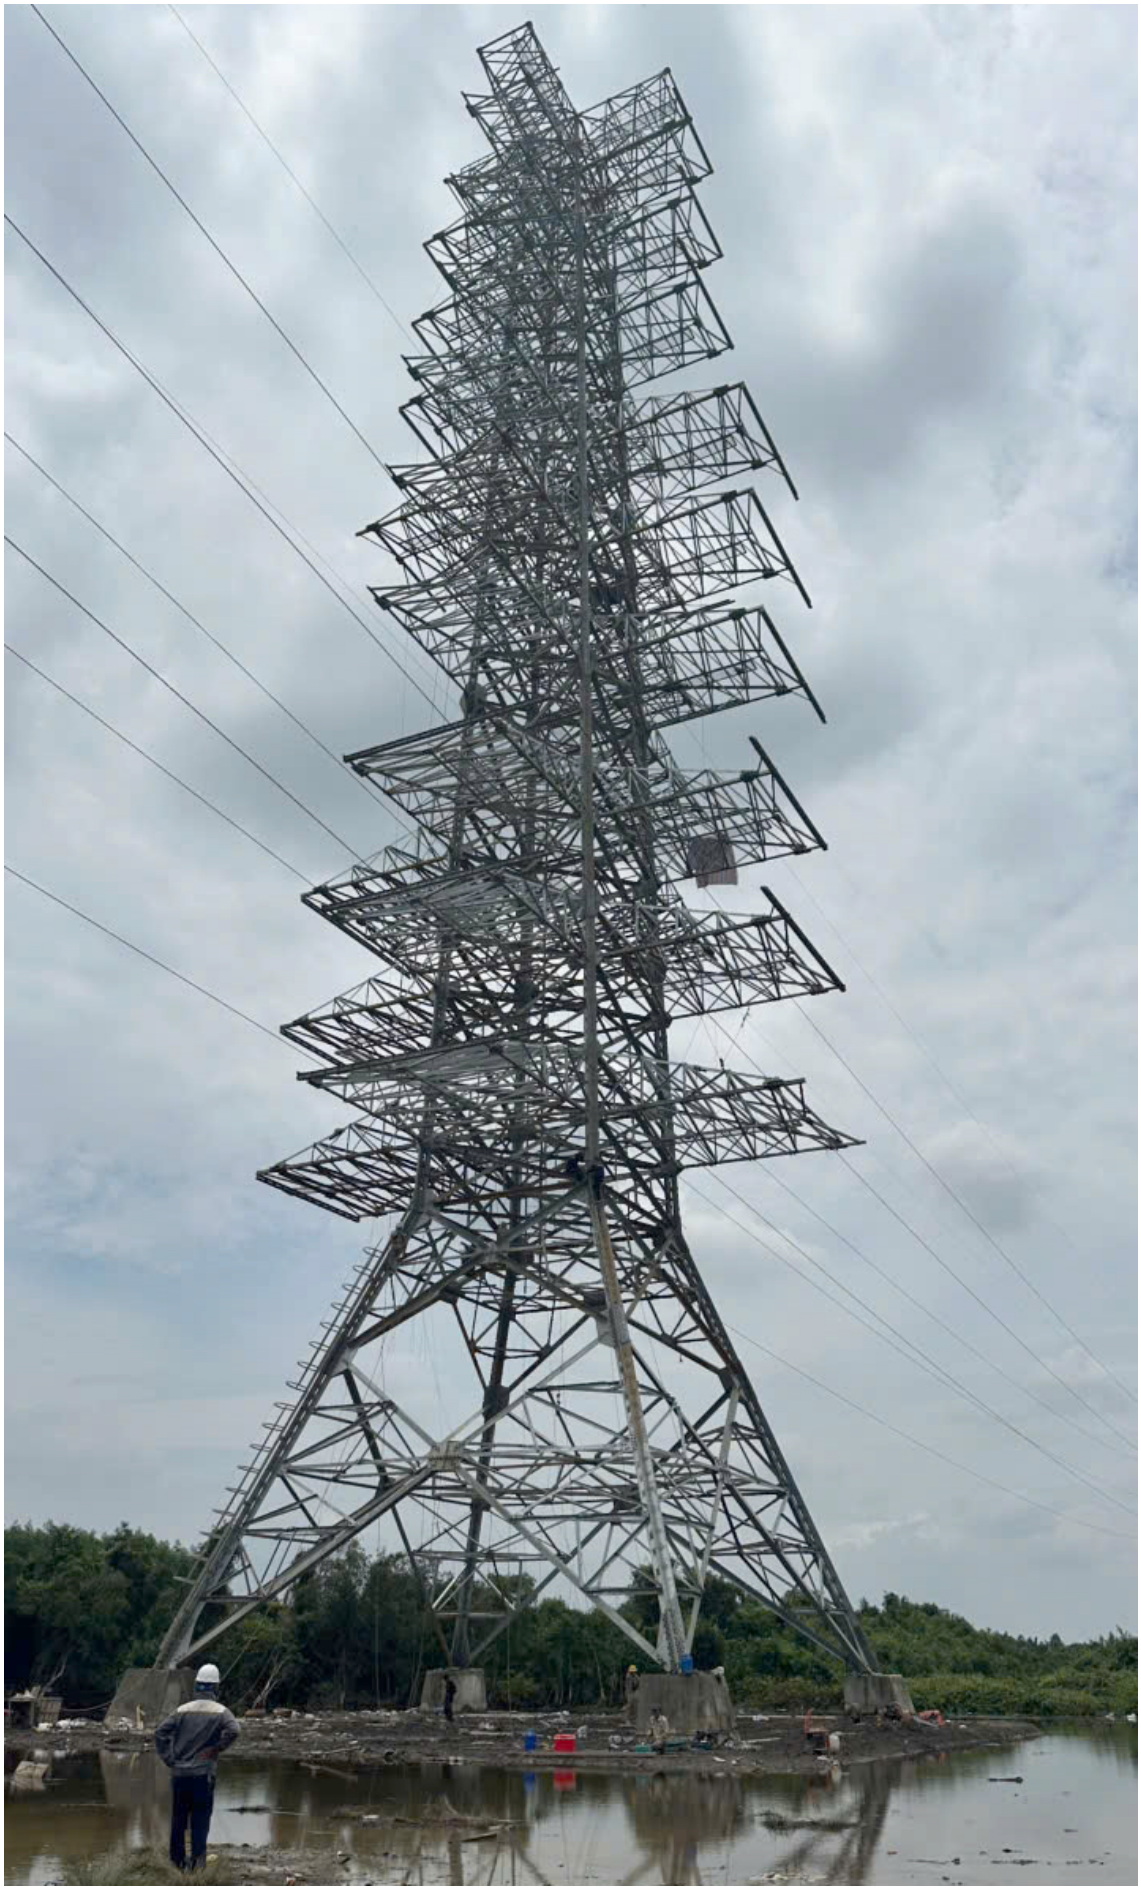

Thi công dựng cột đoạn tuyến đi chung 6 mạch

Mới đây nhất, ngày 21/5/2025, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã họp với UBND tỉnh Đồng Nai và tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ vào cuộc quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng các dự án trước ngày 15/6/2025. Với mốc tiến độ này sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi để SPMB và NPTPMB đẩy nhanh tiến độ thi công.

Chính vì vậy Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú yêu cầu 2 đơn vị cần cần tranh thủ sự ủng hộ của Ban Chỉ đạo, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai để làm việc với chính quyền huyện, xã nhằm hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng (bao gồm cả phần hành lang tuyến) trong tháng 6/2025 (trước thời điểm sáp nhập, tinh gọn bộ máy của tỉnh). Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ các đơn vị cần kịp thời báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai và EVNNPT để có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo xem xét chỉ đạo nhằm hoàn thành bàn công tác bàn giao mặt bằng trong tháng 6/2025.



Thi công dựng cột cụm dự án truyền tải giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

Tổng giám đốc EVNNPT yêu cầu SPMB, NPTPMB thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch và cam kết đã đề ra. Chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Nhơn Trạch, Long Thành và các đơn vị liên quan, thực hiện giải pháp phù hợp đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu xây lắp thi công trong tháng 6/2025. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, NPTPMB kịp thời báo cáo đề xuất về EVNNPT để xem xét, giải quyết nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ Dự án.

Cùng với đó phải yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công, bất cứ khoảng cột, khoảng néo nào có mặt bằng cần có người thi công dựng cột, kéo dây ngay.

Thanh Hải
