
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Vì sao cao tốc Hòa Liên-Túy Loan bị chậm tiến độ?

07:59 28/08/2024

Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang hứa đến ngày 10/9 sẽ cưỡng chế, để có mặt bằng sạch tại những vị trí mà chủ đầu tư đề nghị bàn giao.

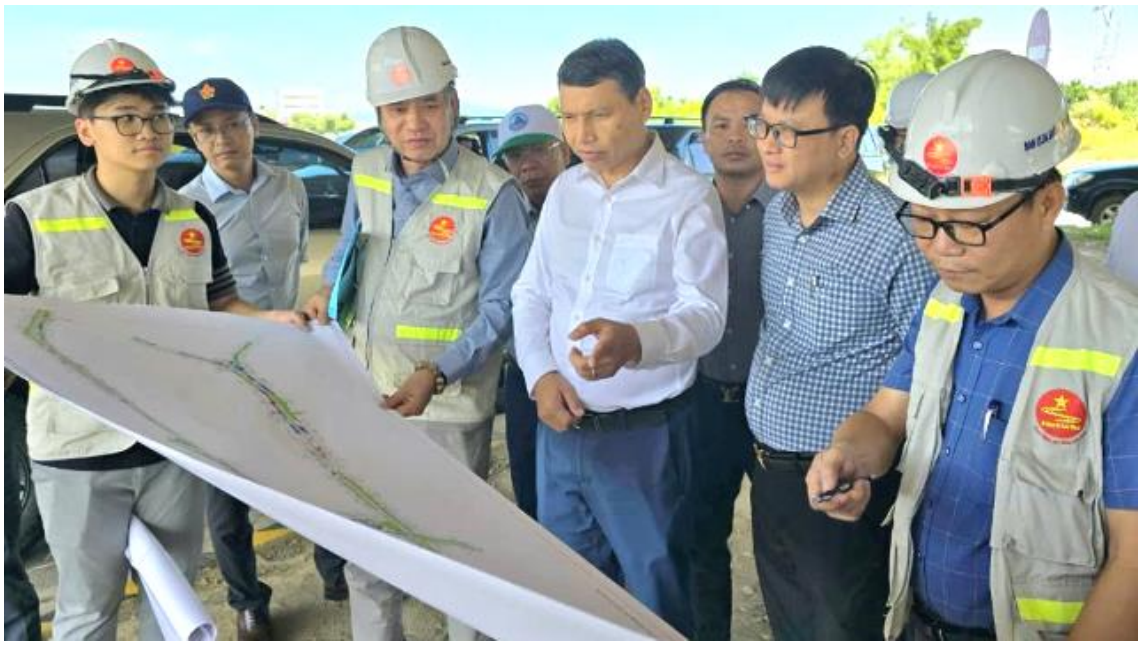

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Chiều 27/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã có buổi kiểm tra tình hình thực tế và làm việc làm việc với UBND huyện Hòa Vang, chủ đầu tư, nhà thầu về tình hình thi công Dự án cao tóc Hòa Liên-Túy Loan.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng, đại diện Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - nhà thầu dự án này, cho biết, hiện dự án đoạn đi qua địa bàn xã Hòa Liên còn vướng nhà dân nên ảnh hưởng đến việc thi công hạng mục cầu trên tuyến; còn tại xã Hòa Sơn, nhà thầu đề xuất trước mắt giải quyết mặt bằng để thi công mở rộng hạng mục cầu vượt ĐT 602 trên tuyến.



Thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan hiện còn vướng một số điểm chưa giải phóng mặt bằng. Ảnh: Hoàng Hữu Quyết

Một nhà thầu khác thi công dự án trên là Công ty TNHH MTV 17 thông tin thêm phần thi công của đơn vị này qua địa bàn các xã: Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Nhơn còn vướng mặt bằng ở một số đoạn cho chưa giải tỏa được một số hộ dân, đáng lưu tâm hơn, khi nhà thầu này đưa phương tiện, thiết bị ra thi công thì bị người dân cản trở. Do vậy, Công ty TNHH MTV 17 đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp hỗ trợ quá trình thi công của nhà thầu.

Về phía chính quyền địa phương, ông Phan Duy Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, khi có tình trạng cản trở thi công thì nhà thầu cần nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương ra xử lý. Theo ông Phan Văn Tôn - Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, hiện toàn dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan (tuyến chính) còn lại 70 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng. UBND huyện Hòa Vang cố gắng đến trước 31/8, bàn giao được khoảng 36 trường hợp, còn 34 hồ sơ phải cưỡng chế nằm trên địa bàn cả 3 xã: Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Nhơn.

Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu gấp rút triển khai thi công tại những vị trí đã được bàn giao mặt bằng. “Hiện nay đang có Tổ xử lý nóng, Huyện đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư rồi, nếu bị cản trở thi công thì 3 xã sẽ xử lý. Nếu xã không làm, tôi sẽ trực tiếp xuống làm”, ông Phan Văn Tôn cam kết.



Lãnh đạo huyện Hòa Vang nói sẽ cưỡng chế, để có mặt bằng sạch tại những vị trí mà chủ đầu tư đề nghị bàn giao. Ảnh Hoàng Hữu Quyết

Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang hứa đến ngày 10/9 sẽ cưỡng chế, để có mặt bằng sạch tại những vị trí mà chủ đầu tư đề nghị bàn giao. Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Tô Văn Hùng nhấn mạnh mặt bằng nào đã bàn giao thì cử lực lượng xuống, tập trung hỗ trợ cho các nhà thầu thi công thi công.

“Những trường hợp thuộc diện tiếp tục vận động thì vận động đến hết ngày 31/8. Sau khi vận động, xem xét hỗ trợ hết cỡ những vẫn không chấp hành lệnh giải tỏa thì sẽ ban hành quyết định cưỡng chế”, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang nhấn mạnh thêm.

Kết luận tại buổi kiểm tra thực tế và buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu ra quân đồng bộ làm tại các điểm tăng tiến độ, vướng chỗ nào địa phương hỗ trợ chỗ đó; yêu cầu chính quyền tập trung toàn lực vào đền bù, giải tỏa cho dự án cao tốc Hòa Liên- Túy Loan…



Dự án do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Ảnh Hoàng Hữu Quyết

Cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan dài 11,5km nằm trên địa bàn các xã Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Nhơn của huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng. Nhà thầu thi công là Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 và Công ty TNHH MTV 17.

Giai đoạn phân kỳ, dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 22m, bề rộng mặt đường 14m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án sẽ có quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 29m. Dự án do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Hoàng Hữu Quyết
