

Bắc Ninh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

06:27 11/11/2025

Tỉnh Bắc Ninh xác định, giải ngân vốn đầu tư công sớm sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên hiện nay, vẫn còn một số đơn vị giải ngân chậm, không bảo đảm yêu cầu. Trước thực tế này, UBND tỉnh tập trung cao chỉ đạo các ngành liên quan, chủ đầu tư tăng tốc giải ngân vốn.

Tỷ lệ chung cao, một số đơn vị đạt thấp

Theo Sở Tài chính, năm nay, tổng kế hoạch vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh là hơn 20.389 tỷ đồng. Đến ngày 2/11, toàn tỉnh giải ngân hơn 12.462 tỷ đồng, đạt 61,1% so với kế hoạch vốn (trong đó giải ngân vốn giao của năm 2025 đạt hơn 11.488 tỷ đồng, bằng 76,1% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Mặc dù kết quả giải ngân vốn của Bắc Ninh được xếp trong nhóm cao của cả nước song chưa đáp ứng được tiến độ của tỉnh đề ra. Toàn tỉnh vẫn còn hàng chục đơn vị, địa phương được giao vốn có kết quả giải ngân đạt thấp dưới 40% so với tổng vốn như các xã: Hiệp Hòa, Văn Môn, Đại Sơn, Sa Lý, Yên Trung, Phúc Hòa...



Thi công dự án xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu.

Sau khi rà soát kết quả giải ngân, ngày 29/10, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn phê bình các cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 của tỉnh như: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Gia Bình (18,1%); Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Lục Ngạn (20,2%); Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Chũ (33,3%); xã An Lạc (17,1%), phường Hạp Lĩnh (28,6%)...

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp ở một số đơn vị, địa phương có nhiều nguyên nhân. Một trong những “nút thắt” lớn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc ở hầu hết các dự án. Tại nhiều công trình, tiến độ bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư chậm, còn tình trạng “xôi đổ” do người dân chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường; thửa đất còn tranh chấp, khó xác định nguồn gốc để hoàn thiện hồ sơ, lập phương án đền bù hoặc người dân phải chờ bố trí tái định cư...

Ví như dự án xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu kết nối tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng đến nay đã bồi thường đạt gần 89% diện tích đất song vẫn còn 12 hộ với diện tích 2.848 m² đất tại thôn Tảo Hòa, xã Trung Kênh chưa được phê duyệt phương án dẫn tới thi công chậm, khó giải ngân vốn. Tại dự án thành phần, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh (thuộc dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội) còn 8 hộ ở xã Chi Lăng đang di dời tài sản; 5 hộ ở phường Mão Điền chờ bàn giao nhà tại khu tái định cư để di chuyển. Dự án đường kết nối từ đường tỉnh 292 qua Khu công nghiệp An Hà, xã Tiên Lục đến đường vành đai Đông Bắc (phường Bắc Giang) còn hơn 10 ha chưa giải phóng mặt bằng...




Thi công đường tỉnh 285B đoạn qua xã Tâm Giang.

Thời gian qua, do giá vật liệu xây dựng tăng nên một số công trình thuộc các xã, phường: Bảo Đài, Phương Liễu, Kép, Nếnh, Nghĩa Phương, Trung Khê, Trường Sơn... phải điều chỉnh tổng mức đầu tư hoặc tạm dừng để hoàn thiện thủ tục. Một số xã có vốn chương trình mục tiêu quốc gia còn lúng túng trong giải ngân khi công trình được điều chuyển từ cấp huyện cũ về cấp xã sau sáp nhập như xã: An Lạc, Sơn Động. Cùng đó, do ảnh hưởng của mưa bão nên hầu hết một số công trình thi công không bảo đảm tiến độ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải ngân vốn ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, sâu sát, thiếu quyết tâm chính trị, chưa phát huy tối đa vai trò của người đứng đầu; năng lực chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu còn hạn chế.

Ưu tiên dự án có khả năng giải ngân cao

Tại hội nghị thường kỳ tháng 10 vừa qua, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, quý IV là chặng nước rút về đích các mục tiêu năm 2025, do đó các ngành, địa phương phải nỗ lực cao nhất bám sát theo mục tiêu ở từng ngành, lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng cả năm của tỉnh đạt 11,5% trở lên. Đồng chí nêu rõ, việc giải ngân vốn đầu tư công sớm sẽ góp phần đáng kể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Do đó, các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần coi đây là nhiệm vụ ưu tiên tập trung, tiếp tục tăng tỷ lệ giải ngân vốn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao cả năm đạt 95%.

Thực hiện sự chỉ đạo trên, đầu tháng 11 năm nay, tổ công tác của tỉnh gồm đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Xây dựng và một số cơ quan liên quan làm việc trực tiếp với các đơn vị, địa phương có kết quả giải ngân thấp để làm rõ nguyên nhân, thống nhất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tổ công tác sẽ giám sát, báo cáo hằng tuần; đơn vị nào không thực hiện sẽ bị phê bình công khai và điều chuyển vốn sang dự án khác. Theo đó, một trong các giải pháp ưu tiên là gỡ vướng thủ tục về đất đai, tích cực tuyên truyền vận động các hộ dân, tạo sự đồng thuận để hoàn thiện phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

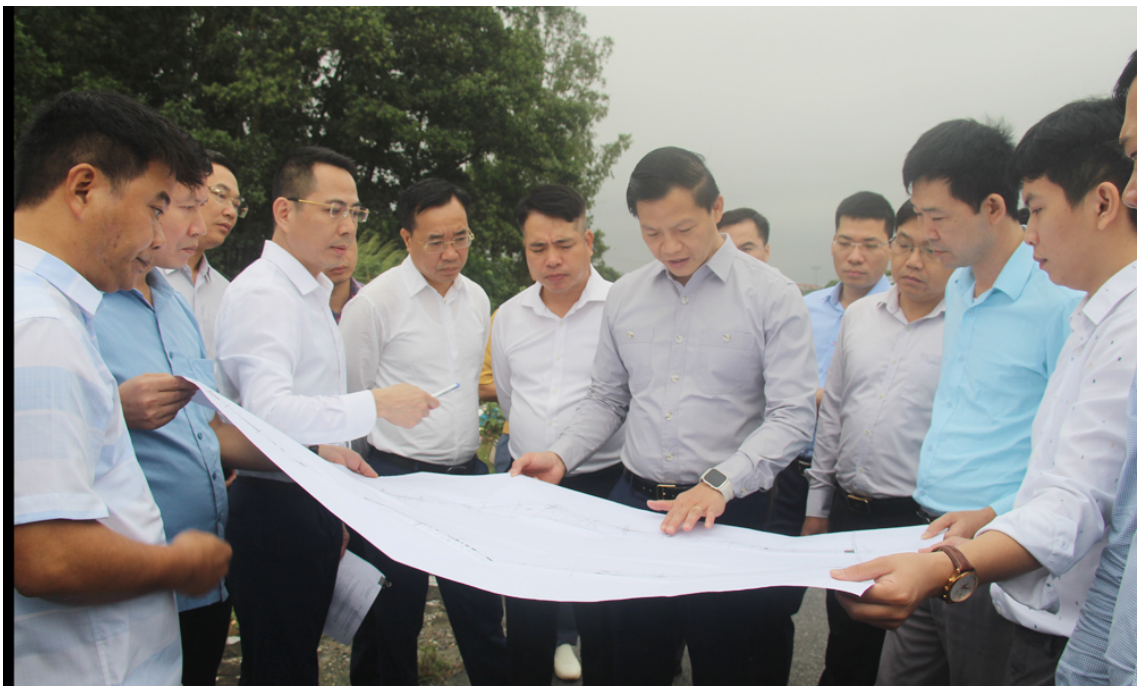

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn kiểm tra tiến độ thi công đường tỉnh 287 đoạn qua xã Yên Phong.

Đối với dự án đường tỉnh 292 qua Khu công nghiệp An Hà đến đường vành đai Đông Bắc, xã Lạng Giang đã chỉ đạo tổ công tác của xã hoàn thành xác định diện tích đất chưa được cấp sổ đỏ của người dân thuộc một phần dự án làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường trong tháng 11 để bàn giao cho chủ đầu tư. Xã Trung Khê liên tục tổ chức đối thoại để vận động người dân đồng thuận, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu kết nối tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng trước ngày 25/11, bàn giao đất cho đơn vị thi công, bảo đảm tiến độ dự án theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh...

Các đơn vị có tỷ lệ vốn giải ngân thấp cũng cam kết giải ngân theo từng mốc thời gian, chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh, cắt giảm kế hoạch vốn đối với các dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án có tiến độ triển khai tốt, có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, kể cả phần vốn bổ sung. Ví như Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 đề nghị điều chỉnh giảm gần 26,7 tỷ đồng vốn thực hiện dự án đầu tư tuyến đường kết nối từ đường tỉnh 295 đến quốc lộ 37 do giá trị thực hiện thấp hơn kế hoạch vốn. Đồng thời đề nghị điều chỉnh giảm hơn 146 tỷ đồng vốn chuẩn bị đầu tư kéo dài của dự án xây dựng khẩn cấp cầu Tà Cang trên đường tỉnh 284...

Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị số 2, Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp Bắc Ninh số 2, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Tân Yên... đang tập trung đôn đốc các nhà thầu thi công “3 ca, 4 kíp”, làm cả ngày nghỉ, thậm chí xuyên đêm để hoàn thiện các hạng mục còn lại, đẩy nhanh giải

ngân vốn.



Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Kênh Vàng.

Với nỗ lực đó, tỉnh phấn đấu hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được giao, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao đời sống người dân.

Bá Đoàn
