TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Hàng loạt sai phạm tại các dự án nhiên liệu sinh học

16:55 01/12/2016

Thực hiện mục tiêu phát triển nhiên liệu sinh học (NLSH) để thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch tryền thống theo Đề án của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 10/2007 - 3/2009, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án NLSH. Tuy nhiên, theo Kết luận số 2634/KL-TTCP ngày 3/10/2016, trong quá trình đầu tư, PVN, các chủ đầu tư, và các đơn vị liên quan đã để xảy ra hàng loạt sai phạm.

Thực hiện mục tiêu phát triển nhiên liệu sinh học (NLSH) để thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch tryền thống theo Đề án của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 10/2007 - 3/2009, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án NLSH. Tuy nhiên, theo Kết luận số 2634/KL-TTCP ngày 3/10/2016, trong quá trình đầu tư, PVN, các chủ đầu tư, và các đơn vị liên quan đã để xảy ra hàng loạt sai phạm.

Kỳ 1: Không khảo sát GPMB, Dự án Dung Quất gây lãng phí 1.125 tỷ đồng

THCL Tại Kết luận số 2634/KL-TTCP ngày 3/10/2016 của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, việc lựa chọn địa điểm xây dựng dự án Dung Quất (Bình Sơn, Quảng Ngãi), các đơn vị liên quan không khảo sát công tác đền bù, GPMB, dẫn tới việc không giải phóng được mặt bằng khi thực hiện dự án, gây lãng phí 1.125 tỷ đồng.



Lễ khởi công Dự án Ethanol Dung Quất

Theo Kết luận Thanh tra, việc lập, thẩm định và phê duyệt Dự án NLSH Dung Quất khi chưa thành lập PCB (chủ đầu tư), PVN đã giao cho Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) chủ trì xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi, tìm địa điểm xây dựng nhà máy.

Năm 2007, Petrosetco đã lựa chọn địa điểm xây dựng, sau đó bàn giao cho PCB. Tuy nhiên, khi lựa chọn địa điểm xây dựng, Petrosetco không khảo sát công tác đền bù GPMB, do đó, khi triển khai thực hiện đầu tư thì không giải phóng được mặt bằng, phải chuyển địa điểm xây dựng nhà máy đến vị trí khác, gây lãng phí toàn bộ chi phí lên tới 1.125 tỷ đồng (chủ đầu tư PCB đã chi trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư ở địa điểm ban đầu; trong đó, chi phí thiết kế theo tổng mặt bằng mới và thuyết minh, thiết kế cơ sở mặt bằng... 853 triệu đồng; chi phí đo đạc cắm mốc, cọc dấu, trích sao bản đồ địa chính 272 triệu đồng).




Không thực hiện khảo sát đến bù, GPMB, Ethanol Dung Quất gây lãng phí 1.125 tỷ đồng

Cụ thể, ngày 6/10/2008, chủ đầu tư PCB và nhà thầu tư vấn CECO đã ký hợp đồng số 03/200/HĐ-PCB-CECO về việc lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Bio-Ethanol, công xuất 100 triệu lít/năm, tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), giá trị Hợp đồng tạm tính là 4.253 triệu đồng; ngày 6/10/2008, hai bên ký phụ lục hợp đồng với giá trị tăng thêm 853 triệu đồng.

Ngày 3/11/2009, chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn CECO có Biên bản số 09.03/HS-KHKD nghiệm thu Dự án đầu tư xây dựng công trình, Hồ sơ dự án gồm: Phần thuyết minh dự án và phần bản vẽ thiết kế cơ sở...; ngày 9/11/2009, hai bên có Biên bản quyết toán và thanh lý Hợp đồng với tổng giá trị là 3.703 triệu đồng.

Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất Bio - Ethanol Dung Quất, được Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất thẩm định Dự án đầu tư – Thiết kế cơ sở; HĐQT PCB đã ban hành Quyết định số 03/QD-PCB ngày 30/3/2009 Phê duyệt Dự án đầu tư, do thay đổi địa điểm xây dựng nhà máy nên HĐQT đã có Quyết định số 28/QĐ-PCB ngày 22/6/2009 Phê duyệt Dự án điều chỉnh với tổng mức đầu tư 1.493,019 tỷ đồng.

Việc chủ đầu tư PCB thuê nhà thầu tư vấn CECO lập Dự án đầu tư – Thiết kế cơ sở là thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

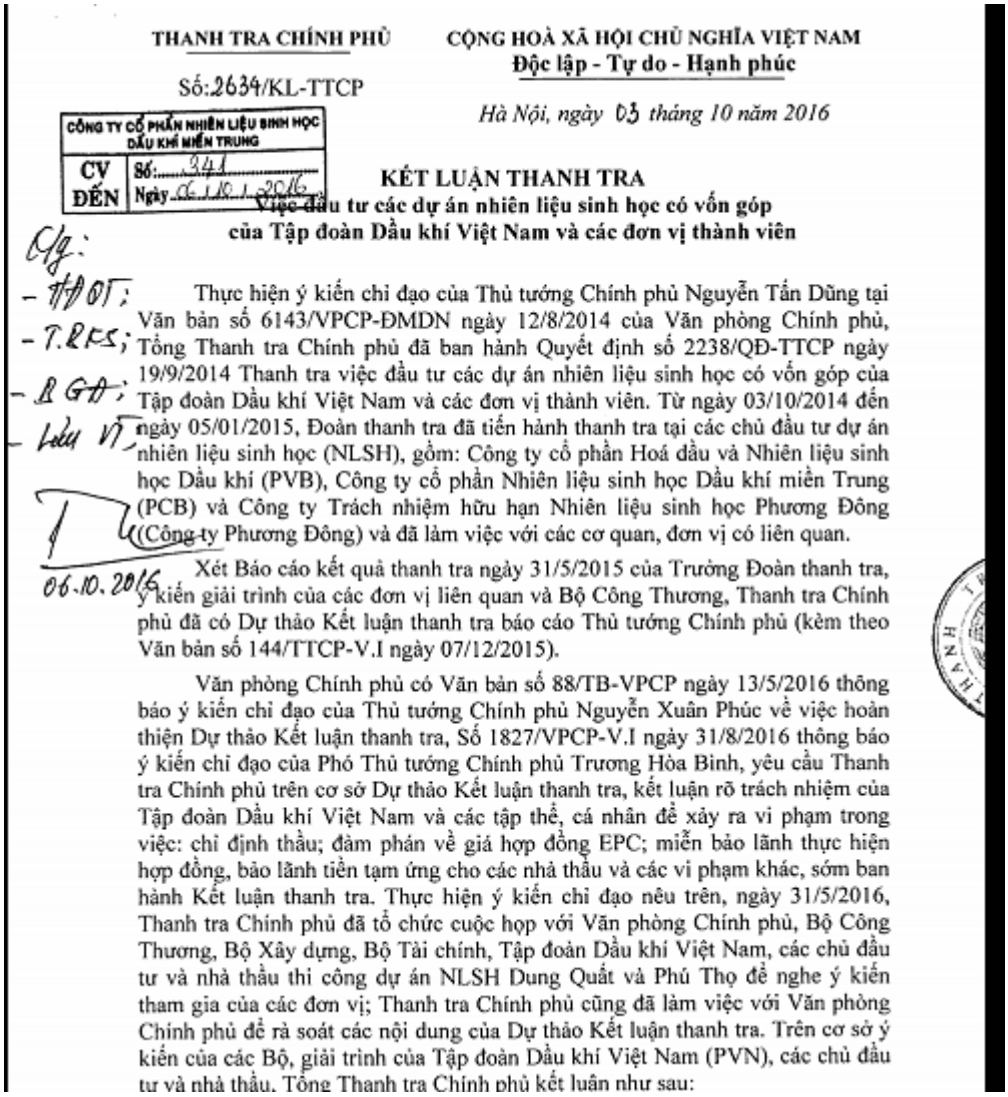

THANH TRA CHÍNH PHỦ

Số: 2634/KL-TTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SINH HỌC DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
CV ĐẾN Số: 341
Ngày 06/10/2016

KẾT LUẬN THANH TRA
Việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học có vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Văn bản số 6143/VPCP-ĐMDN ngày 12/8/2014 của Văn phòng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2238/QĐ-TTCP ngày 19/9/2014 Thanh tra việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học có vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên. Từ ngày 03/10/2014 đến ngày 05/01/2015, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại các chủ đầu tư dự án nhiên liệu sinh học (NLSH), gồm: Công ty cổ phần Hoá dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB), Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung (PCB) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhiên liệu sinh học Phương Đông (Công ty Phương Đông) và đã làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 31/5/2015 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của các đơn vị liên quan và Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ đã có Dự thảo Kết luận thanh tra báo cáo Thủ tướng Chính phủ (kèm theo Văn bản số 144/TTCP-V.I ngày 07/12/2015).

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 88/TB-VPCP ngày 13/5/2016 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc hoàn thiện Dự thảo Kết luận thanh tra, Số 1827/VPCP-V.I ngày 31/8/2016 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, yêu cầu Thanh tra Chính phủ trên cơ sở Dự thảo Kết luận thanh tra, kết luận rõ trách nhiệm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm trong việc: chỉ định thầu; đàm phán về giá hợp đồng EPC; miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng cho các nhà thầu và các vi phạm khác, sớm ban hành Kết luận thanh tra. Thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên, ngày 31/5/2016, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức cuộc họp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án NLSH Dung Quất và Phú Thọ để nghe ý kiến tham gia của các đơn vị; Thanh tra Chính phủ cũng đã làm việc với Văn phòng Chính phủ để rà soát các nội dung của Dự thảo Kết luận thanh tra. Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, giải trình của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), các chủ đầu tư và nhà thầu, Tổng Thanh tra Chính phủ kết luận như sau:

Kết luận thanh tra về các dự án nhiên liệu sinh học của Thanh tra Chính phủ

Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sản xuất Bio - Ethanol Dung Quất, do PCB làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư là 1.493,019 tỷ đồng; tổng mức đầu tư điều chỉnh là 1.886,988 tỷ đồng (tăng 393,969 tỷ đồng). Trong đó, cổ đông góp vốn (thời điểm tháng 10/2014), gồm; Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn 599,02 tỷ đồng (61%); PVOil 380,525 tỷ đồng (38,75%); Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí là 2,455 tỷ đồng (0,25%).

Hiện tại, dự án đã đầu tư và xây dựng xong, tuy nhiên hầu như không vận hành...?

Thương hiệu & Công luận sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Tuấn Ngọc
